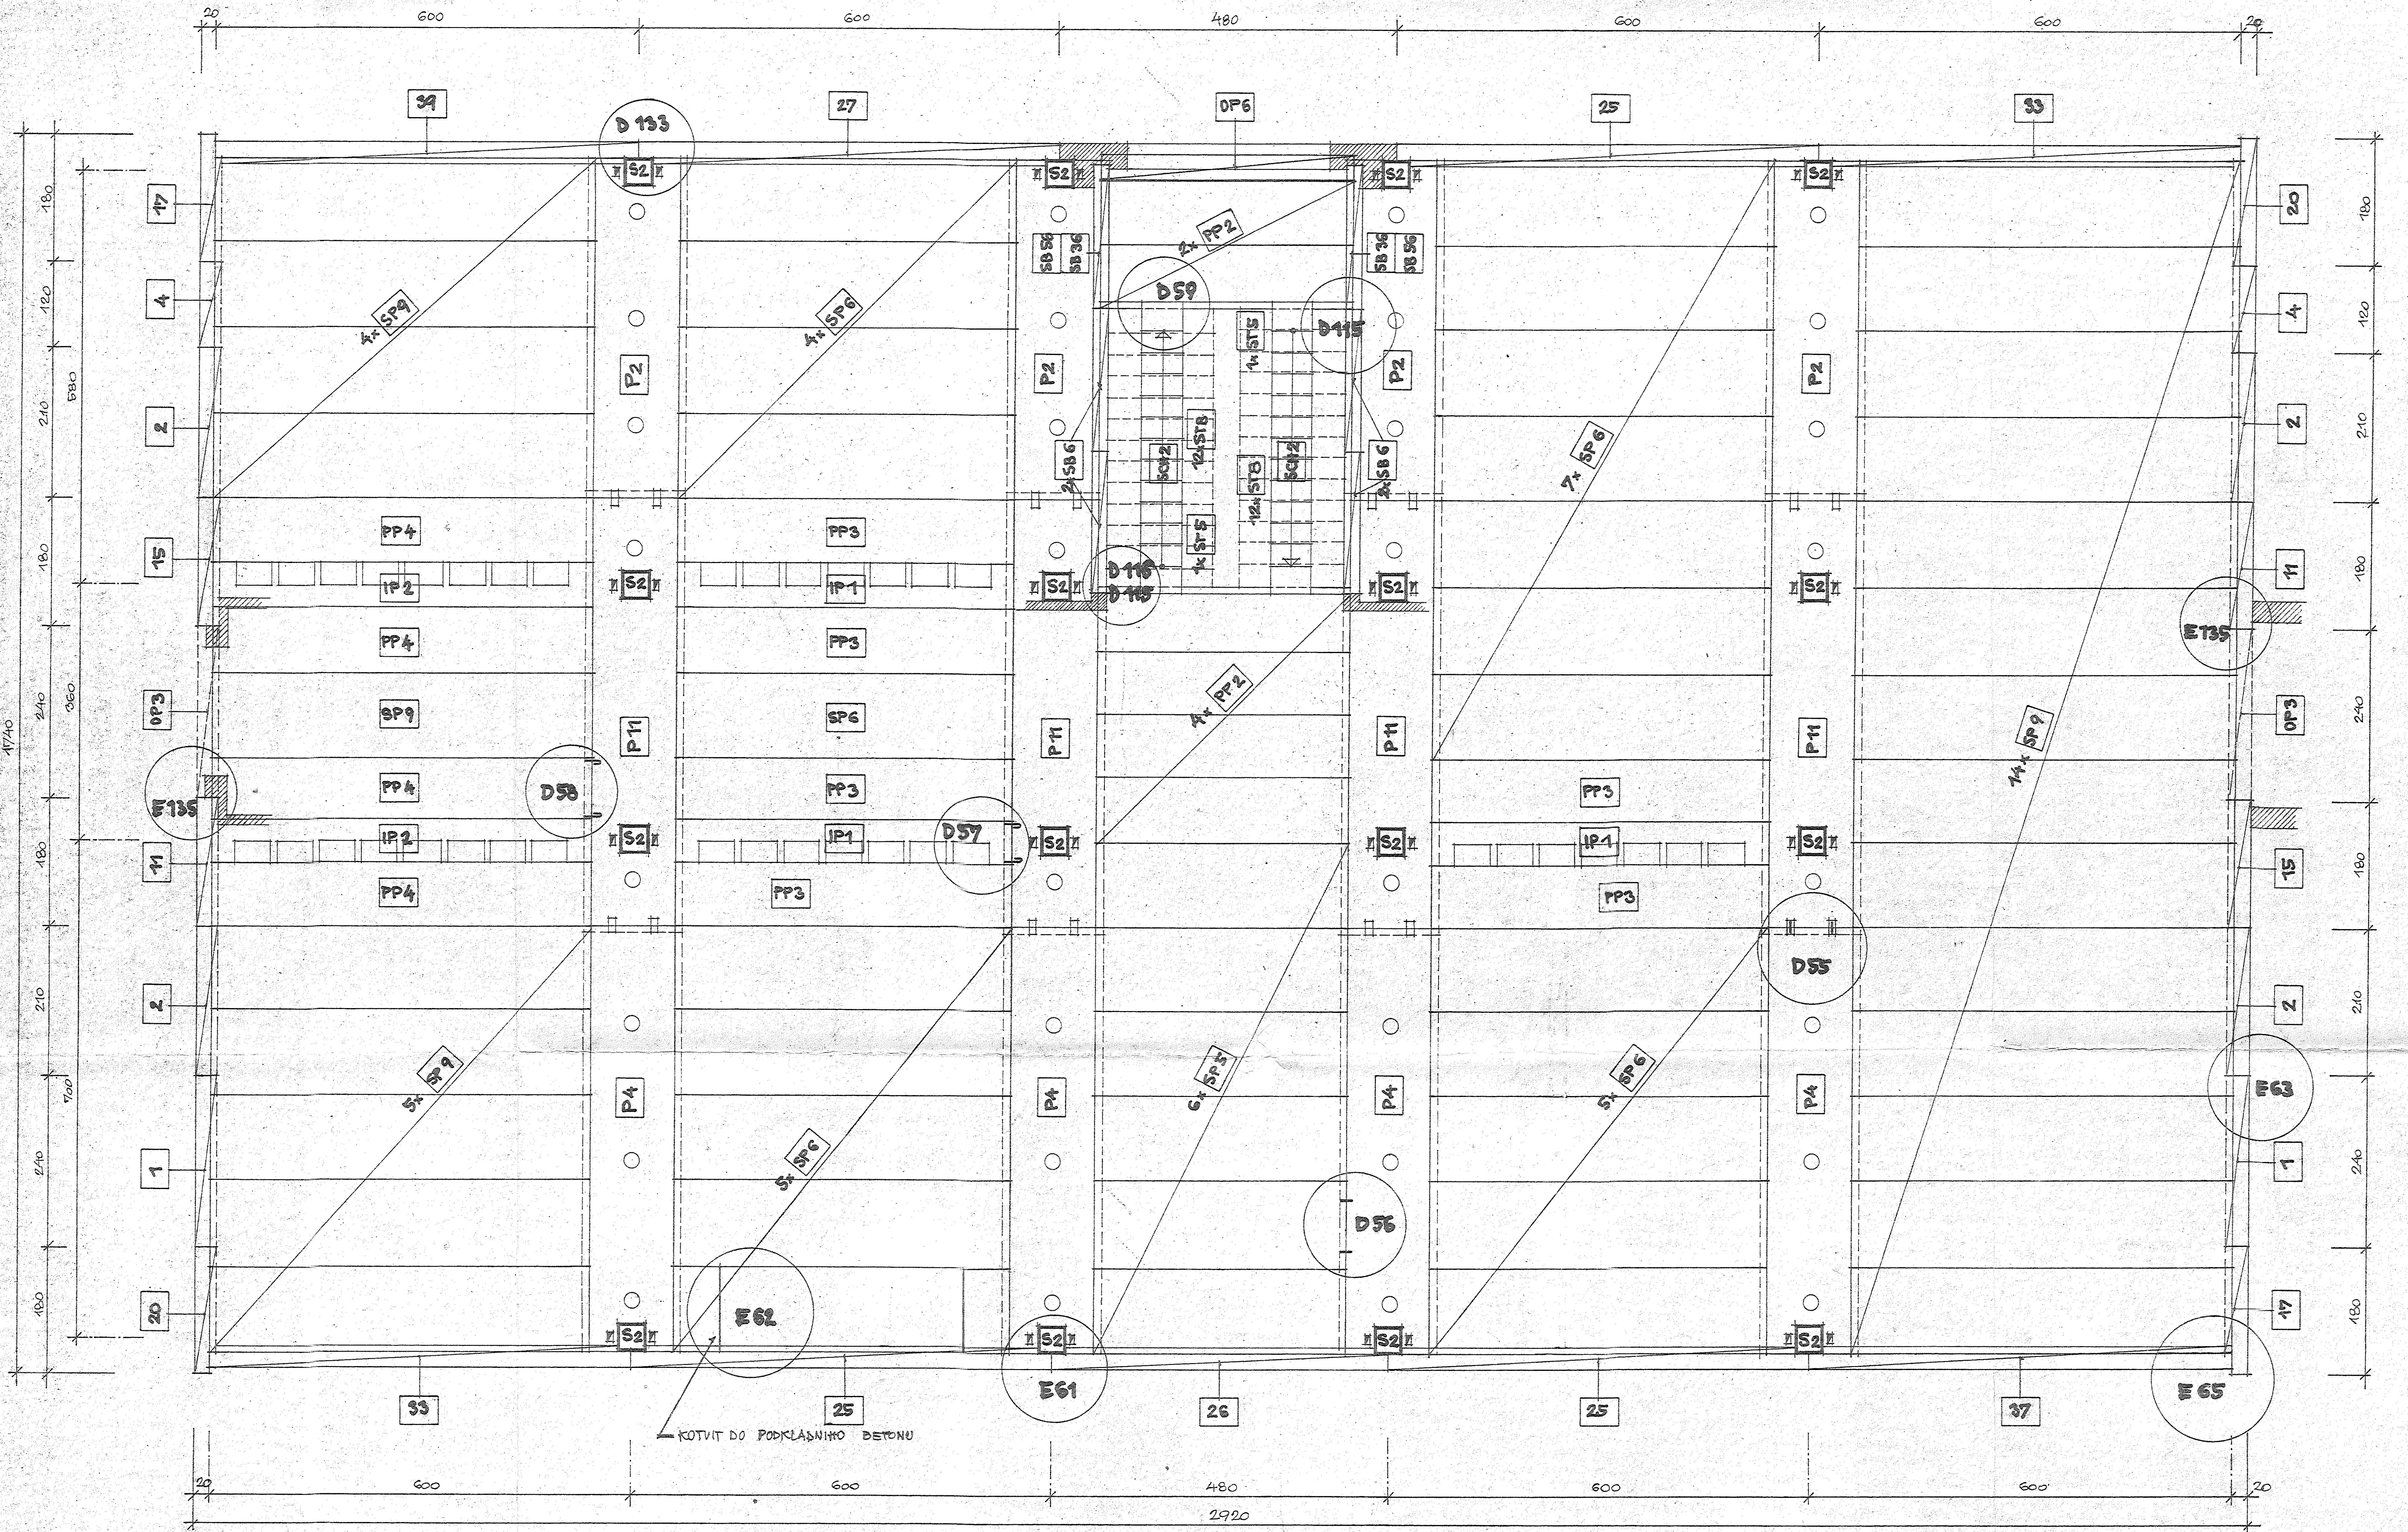
20
600
600
480
600
600
20
2920
39
27
OP6
25
33
33
25
26
25
37
D 133
D59
D115
D116
D118
D58
D57
D55
D56
E135
E63
E62
E61
E65
S2
P2
P4
P11
SP5
SP6
SP9
PP2
PP3
PP4
IP1
IP2
SB6
SB36
SB56
SCH2
ST8
ST5
4× SP9
4× SP6
7× SP6
14× SP9
5× SP9
5× SP6
6× SP5
4× PP2
2× PP2
1× ST5
12× ST8
17
4
2
15
OP3
11
1
20
180
120
240
210
1740
360
880
KOTVIT DO PODKLADNÍHO BETONU

KONSTRUKCE

ZN.	STARÉ OZN.	NOVÉ OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR CM	KS
S2		VZS 2/77	SLOUP	39/39/333	16
P2		RZT 2/77	PRŮVLAK (KRAJNÍ)	$\frac{116}{141}$/25/478	4
P4		RZT 4/77	PRŮVLAK (KRAJNÍ)	$\frac{116}{141}$/25/598	4
P11		RZT 11/77	PRŮVLAK (HLAVICE)	$\frac{116}{141}$/25/597	4
SP5	PZD 5/67	PZD 35/77	STROPNÍ PANEL	118/25/358	6
SP6	PZD 6/67	PZD 36/77	STROPNÍ PANEL	118/25/478	22
SP9	PZD 9/67	PZD39/77	STROPNÍ PANEL	118/25/538	24
PP2		DZH 52/77	PODESTOVÝ PANEL	89/25/358	6
PP3		DZH 53/77	PODESTOVÝ PANEL	89/25/478	6
PP4		DZH 54/77	PODESTOVÝ PANEL	89/25/538	4
IP 1		PZD 1/77	INSTALAČNÍ PANEL	58,5/25/478	3
IP 2		PZD 2/77	INSTALAČNÍ PANEL	58,5/25/538	2

KONSTRUKCE

ZN.	STARÉ OZN.	NOVÉ OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR CM	KS
SB6		NZD 6/77	STĚNOVÝ PANEL	198/20/332	4
SB 36		NZD 36/77	STĚNOVÝ SCHODIŠŤ.(SPODNÍ)	198/20/178,5	2
SB 56		NZD 56/77	STĚNOVÝ SCHODIŠŤ.(HORNÍ)	198/20/152	2
SCH 2		DZH 2/77	SCHODNICE	388/59/180	2
ST 8		DZH 35/77	SCHODIŠŤ. STUPEŇ (NORMÁL.)	150/35/14,5	24
ST 5		DZH 22/77	SCHODIŠŤ. STUPEŇ (NÁSTUP.)	150/30/7	2

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZN.	OZN. DÍLCE	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR CM	KS
1	NOD 601/77	ŠTÍT. PANEL ŘADOVÝ	238/30/365	2
2	NOD 606/77	ŠTÍT. PANEL ŘADOVÝ	208/30/365	4
4	NOD 610/77	ŠTÍT. PANEL ŘADOVÝ	118/30/365	2
11	NOD 613/77	ŠTÍT. PANEL U OTVORU (LEVÝ)	178/30/365	2
15	NOD 614/77	ŠTÍT. PANEL U OTVORU (PRAVÝ)	178/30/365	2
17	NOD 615/77	ŠTÍT. PANEL KONCOVÝ (LEVÝ)	178/30/365	2
20	NOD 616/77	ŠTÍT. PANEL KONCOVÝ (PRAVÝ)	178/30/365	2
25	NOV 602/77	PARAPETNÍ PANEL ŘADOVÝ	598/30/122	3
26	NOV 612/77	PARAPETNÍ PANEL ŘADOVÝ	478/30/122	1
27	NOV 629/77	PARAPETNÍ PANEL ŘADOVÝ	598/30/152	1
33	NOV 603/77	PARAPETNÍ PANEL KONC. (LEVÝ)	598/30/122	2
37	NOV 604/77	PARAPETNÍ PANEL KONC. (PRAVÝ)	598/30/122	1
39	NOV 631/77	PARAPETNÍ PANEL KONC. (PRAVÝ)	598/30/152	1

DOPLŇUJÍCÍ PRVKY - VÝROBNA TOMICE

ZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR CM	KS
OP3	PŘEKLAD (NAD OTVOREM)	28/39/ $\frac{239}{279}$	2
OP6	PŘEKLAD (VE SCHODIŠTI)	40/25/358	1

KRESLIL		VED. ODDĚLENÍ	KOSÍK	OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK projekční oddělení BENEŠOV
PROJEKTANT	FILIP	TECHN. KONTROLA		
VEDOUCÍ PROJ.	FULÍN		ŠEBEK	
KNV: PRAHA	ONV: BENEŠOV		ČERČANY	ZAK. ČÍSLO: 45/80 — ARCH. ČÍSLO: 2894
STAVBA: PŘÍSTAVBA ZŠ ČERČANY UČEBNOVÝ PAVILON				STUPEŇ: PP — 10/82 1:50
INVESTOR: ONV BENEŠOV				OBSAH: PREFA STROP NAD PŘÍZEM.

14
